HAUSPLAN / KELLER

Keller freilegen, abdichten, dämmen

Vorprojektplan mit modellbezogenen Sektionen und Aushub-/Schachtblättern

13 Sektionen. Ein abgestimmter Bauablauf.

Räumliche Sektionen werden später in bemessene Arbeitsfelder gegliedert. Die Nummern PS01–PS13 sind keine Ausführungsreihenfolge. Kein Arbeitsfeld ist in diesem Stand zur Herstellung freigegeben.


Vorhanden	Noch zu ermitteln
G02-Modell und native NX-Lieferung; Außenkonturen und Planhöhen.	Fundamente, Baugrund, Wasser, aktuelle Leitungen und bestätigte Grenzen.
Geometrisch begründete Sektionsgliederung; Varianten A/B je Sektion.	Zulässige Feldlängen/-tiefen, Sicherung, Schachtmaße, Mengen und Termine.
Eigene Planblätter und vorgesehene NX-Unterbaugruppen.	Ausführbare Renovierungs-.prt und fachliche Ausführungsnachweise.

Nächster verbindlicher Schritt: Bestandsuntersuchung U01–U06 mit Tragwerks- und geotechnischer Fachplanung. Der Nutzer hat am 01.11.2026 bestätigt, dass belastbare Unterlagen fehlen. Der gewünschte Aushub bis 100 mm unter UK Bodenplatte bleibt ein Prüfziel.

Lesen: Seite 2 Übersicht; 3 Untersuchung; 4 Querschnitte; 5 Schächte; 6–18 Einzelblätter; 19 Ablauf/Mengen; 20 NX-Struktur; 21 Quellen. Ausführlicher Projektplan: docs/plans/2026-11-01-keller-aushub-und-schachtplanung.md.

Lageplan der 13 Sektionen

Ausschnitt aus G02; Modellmaße in mm. Kartengrenze ist kein vermessener Grenznachweis.

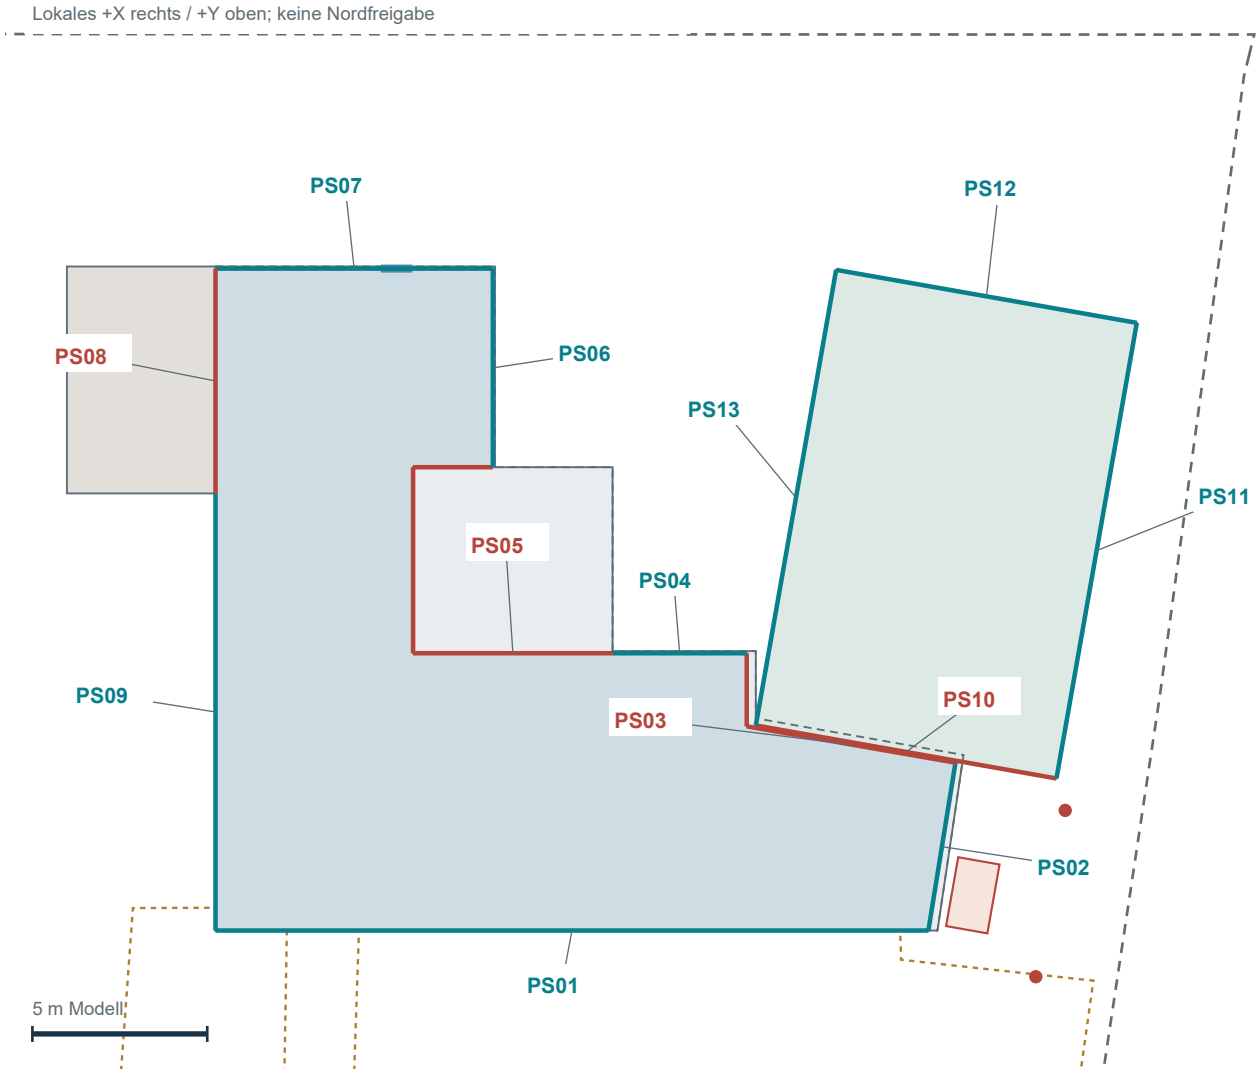

Farben und Linien
Blaugrau: Hauptkeller; Grün: Anbau
Grau: EG-Umriss / Garage
Türkis: Planungssektion
Rot: Konflikt / Geländer / Stützen
Blauer Strich: Lichtschachthinweis
Ocker: historische Medienlinien
Gestrichelt grau: Kartengrenze

Besonders kritische Zonen
PS03/10: Hauptbau–Anbau
PS05: abweichender EG-Überbau
PS08: Garage unmittelbar außen

Auch die türkis gezeigten Sektionen sind noch nicht zur Ausführung freigegeben.

Engpass PS11/12
Ca. 2088 mm kleinster 2D-Abstand zwischen Anbaukontur und Kartengrenze. Arbeitsraum, Böschung/Verbau, Einbau, Schutz und Lastabstände müssen vollständig hineinpassen. Nicht als verfügbare Grabenbreite verwenden.

Modellquelle: haus.json; Hash/Polylinien im Sektionskatalog. Keine konturverändernde Bereinigung.

Untersuchen, bevor Felder bemessen werden

Auch Suchschachtungen benötigen ein zuvor festgelegtes sicheres Untersuchungsverfahren.

Paket	Verantwortliche Funktion	Ergebnis vor weiterer Planung
U01	Vermessung	GOK je Sektion, Sockel/Platte, Anschlüsse, Kellerabgang, Grenze und Abweichungen zum Modell.
U02	Tragwerksplanung	Gründung, Aufstandsflächen, Lastabtrag und Bestandsschäden; sichere Aufschlussstellen und Bauzustände.
U03	Geotechnik	Schichten/Auffüllungen, Festigkeit, Lagerung, Verformung, Durchlässigkeit und Wasserverhältnisse.
U04	Betreiber / Ortung	Aktuelle Medien, örtliche Lage und Tiefe; fehlende Wasser-/Abwassernetze ergänzen.
U05	Abdichtungsplanung	Feuchteursachen, Untergrund, Wassereinwirkung, Fugen, Sockel, Durchdringungen und Dämmkonzept.
U06	Bauleitung / Fachplanung	Maschinen-/Lagerlasten, Flächen, Zugang, Wasser, Messung und Stop-/Wiederanlaufregeln.


Vorrangige Untersuchungszonen: PS03/10 (Anschluss), PS05 (Überbau), PS08 (Garage), PS02 (Stützen/Abgang), PS11/12 (Grenzengpass), repräsentativer Hauptkeller und PS07 (Lichtschacht). Anzahl, Lage und Tiefe der Aufschlüsse legt die Fachplanung fest; keine vorgegebene Zahl von Löchern.

Freigabeprinzip: Belege müssen örtlich zum Feld und zur Planrevision passen. Fehlende oder geänderte Daten sperren abhängige Felder. Erkundung, CAD-Prüfung und Standsicherheitsnachweis sind getrennte Ergebnisse.

Zwei Aushubvarianten, zwei Nachweisaufgaben


Boden-/Verbausicherheit und Gebäudestandsicherheit sind getrennt zu untersuchen. [Q01–Q06]

A | Böschung (unbemessen)

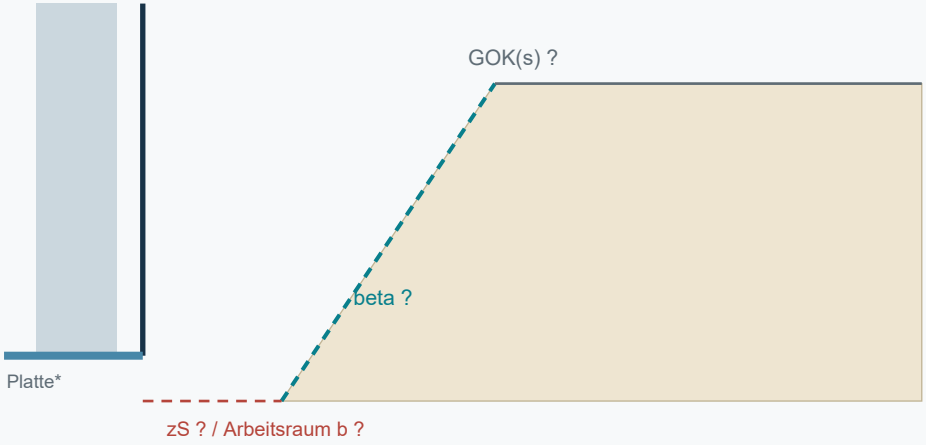

* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)

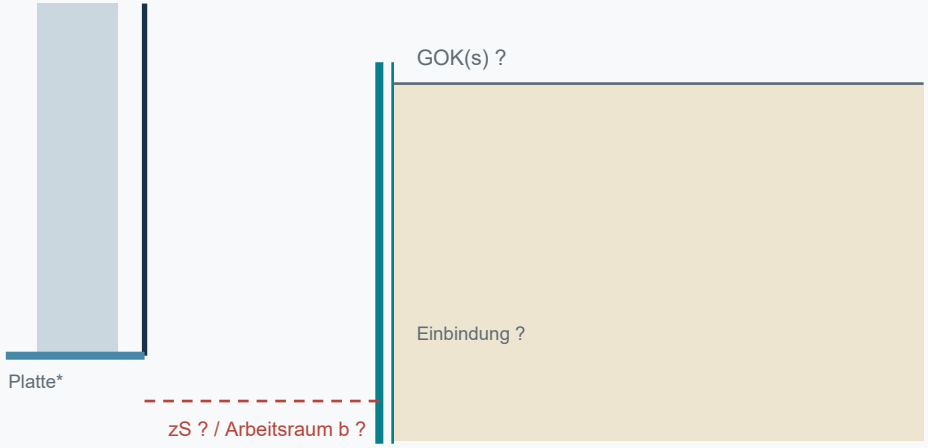

* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Parameter / Zusammenhang	Status in V01
h(s) = GOK(s) − zS(s); b = lichter Arbeitsraum	GOK örtlich prüfen; zulässige Sohle und b noch offen.
A: horizontaler Böschungsanteil r = h / tan(beta)	Nur Geometrie einer idealisierten ebenen Querschnittsform; kein Standsicherheitsnachweis.
B: Verbau, Einbindung, Aussteifung, Ein-/Rückbau	Nach Boden, Wasser und Lasten bemessen; Hauswand kein ungeprüftes Widerlager.
Hauptkeller: UK Platte −2505; Prüfziel −2605 mm	Modellwerte. Fundament-/Aufstandsgeometrie unbekannt; nicht als Grabsohle übernehmen.
Anbau: FFB −1860 mm; Bodenplatte fehlt	UK Platte und Prüfziel unbekannt. FFB nicht ersatzweise verwenden.


Kein Winkel, keine Feldlänge und keine zulässige Sohle vorgegeben. Stirnseiten, Ecken, Auflasten, Wasser und alle Zwischenzustände gehören in die Bemessung.

Schachtregister und Anschlussplanung

Arbeitskammer, Kellerabgang und Lichtschacht getrennt führen; keine erfundenen Schachtmaße.

Plan-ID	Modellbezug	Nächste Klärung
SCH-PS01-MED	Historische Anschlusslinien bei PS01	Aktuelle Ortung/Betreiberabstimmung. Kammer nur bei Bedarf.
SCH-PS02-ABG	Nur geschätztes Geländer bei PS02	Treppe, Wände, Sohle, Schwelle, Ablauf und Gründung aufnehmen.
SCH-PS07-LIC	Quellenhinweis an KG_AW_09	X 4730–5630 / Y 18930 mm beschreibt Fensterbezug, nicht Schachtgröße.
SCH-PS09-MED	Telefonhinweis nahe PS09-Ende	Lage/Tiefe und Schutz klären.
SCH-PSxx-Fnn	Künftiges bemessenes Arbeitsfeld	Länge, Breite, Tiefe, Erd-/Stirnseitensicherung, Zugang, Rettung und Montagefolge.

Arbeitskammer: Draufsicht, symbolisch




Alle Erd- und Stirnseiten sichern; keine Maßvorgabe.

Entwässerung bleibt eine Planungsentscheidung.
Keine umlaufende Dränage, kein Pumpensumpf und keine Ableitung ohne geklärte Wasserbeanspruchung und Abstimmung. Lichtschachtanschlüsse einschließlich Rückstauschutz und Befestigung objektspezifisch planen.

Freilegung, Untergrundvorbereitung, Abdichtungsanschluss und Verfüllung können unterschiedliche Sicherungs-/Zugangsbedingungen haben. Alle relevanten Zustände zeichnen. [Q08–Q10]

PS01 | Leitungen und Gelände

Aushub-/Schachtblatt PS01 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

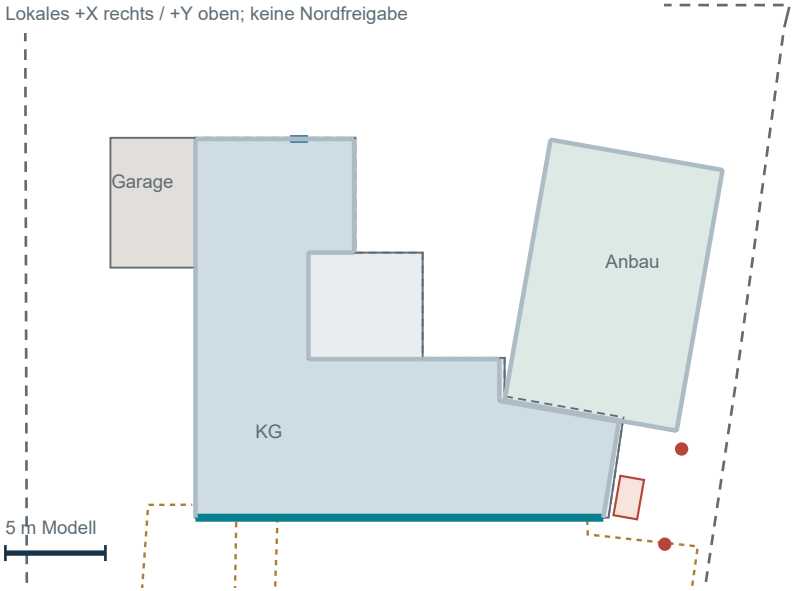

Konturlänge: 20.385 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_01: (0; 0) → (20385; 0)

Variantenbewertung

A/B offen. Vor Flächenwahl Strom, Gas und Telekom orten; auffällige Geländesenke vermessen.


Besondere Konflikte

Historische Strom-, Telefon- und Gas-Hausanschluesse; Tiefen unbekannt; Fenster; Gelaende im DGM ungleichmaessig; Fundamente/Baugrund/Wasser nicht belegt

SCH-PS01-MED


Medien-Arbeitskammer nur bei Bedarf. Lage/Tiefe/Abmessungen offen; Betreiberplan und Ortung erforderlich.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS02 | Abgang und Balkonstützen

Aushub-/Schachtblatt PS02 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

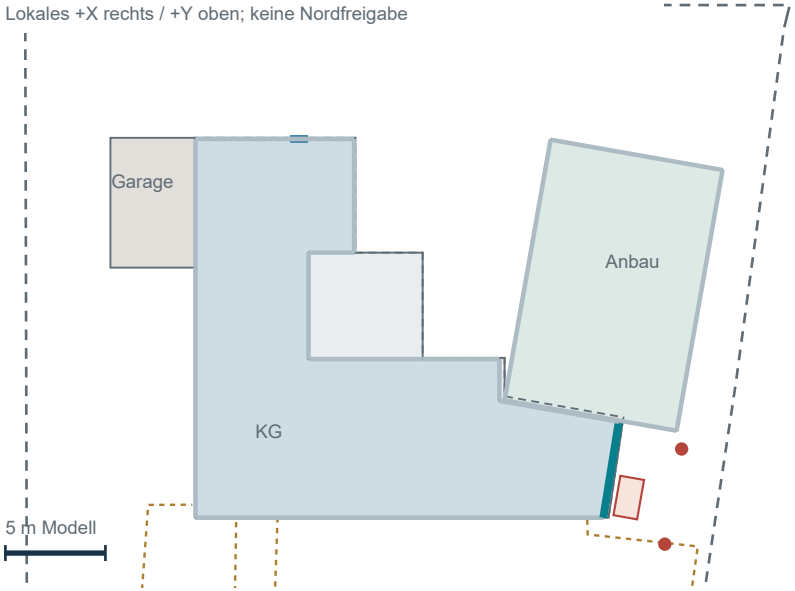

Konturlänge: 4.862 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_02: (20385; 0) → (21160; 4800)

Variantenbewertung

B vertieft untersuchen. A benötigt Platznachweis neben Abgang/Stützen. Keine Reaktionskräfte gegen ungeprüfte Bauteile.


Besondere Konflikte

Kellerabgang nur geschaetztes Gelaender, keine Schacht- oder Treppengeometrie; Balkonstuetzen mit unbekannten Fundamenten; Anbauanschluss am oberen Ende

SCH-PS02-ABG


Nur geschätztes Geländer modelliert. Treppe, Sohle, Wände, Ablauf und Gründung fehlen; Zugang erhalten.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS03 | Hauptbau / Anbau

Aushub-/Schachtblatt PS03 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

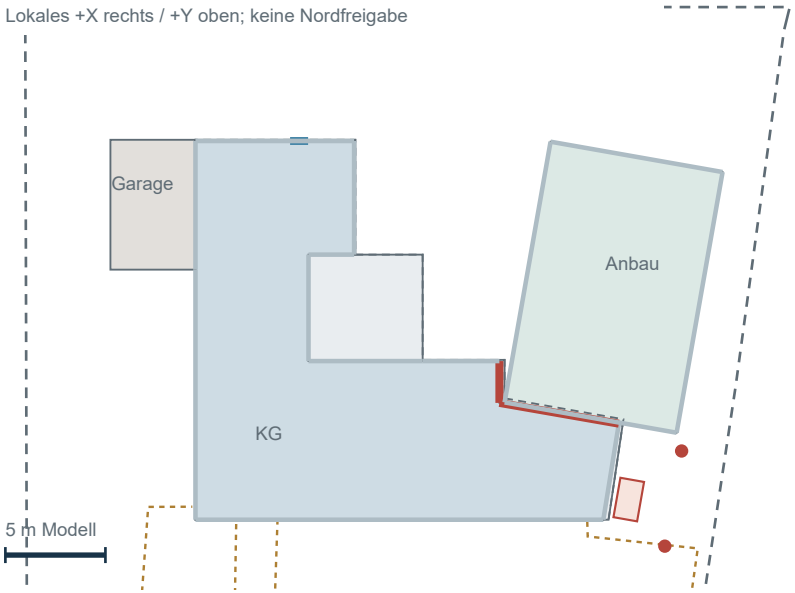


Konturlänge: 8.150 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_03: (21160; 4800) → (15190; 5840) | KG_AW_04: (15190; 5840) → (15190; 7930)


A/B unten nur Prinzipbilder; Standard-Außengraben hier gesperrt.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Variantenbewertung

A/B als Standard-Außengraben gesperrt. Zuerst Haupt-/Anbaukontakt, Gründung und reale Zugänglichkeit klären.

Besondere Konflikte

Gegenueberliegende Hauptbau-/Anbaukonturen mit nur ca. 57 bis 69 mm Abstand an KG_AW_03; KG_AW_04 schmale Anschlusszone; kein nachgewiesener Arbeitsraum; Unterschiedliche Kellerhoehen und ungeklaerte Gruendungsanschluesse

SCH-PS03-Fnn

Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS04 | Versatz und Anbauecke

Aushub-/Schachtblatt PS04 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

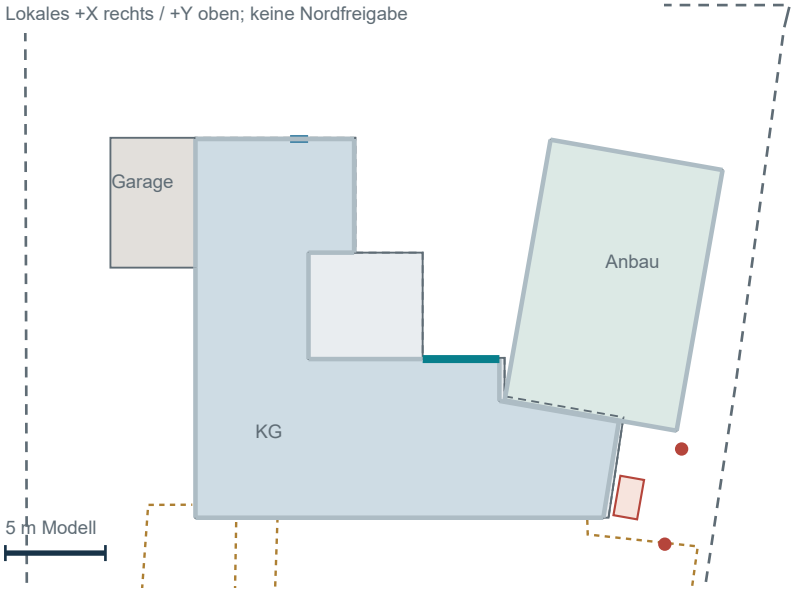

Konturlänge: 3.835 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_05: (15190; 7930) → (11355; 7930)

Variantenbewertung

A/B offen. Engen Anschluss zu PS03/PS13 und EG-Versatz mit Eck- und Fundamentnachweis lösen.


Besondere Konflikte

Anbauecke bei x=15190; engster Konturabstand dort ca. 615 mm; EG-Umrissversatz und Ecke gesondert pruefen

SCH-PS04-Fnn


Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS05 | Überbauter Kellerbereich

Aushub-/Schachtblatt PS05 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

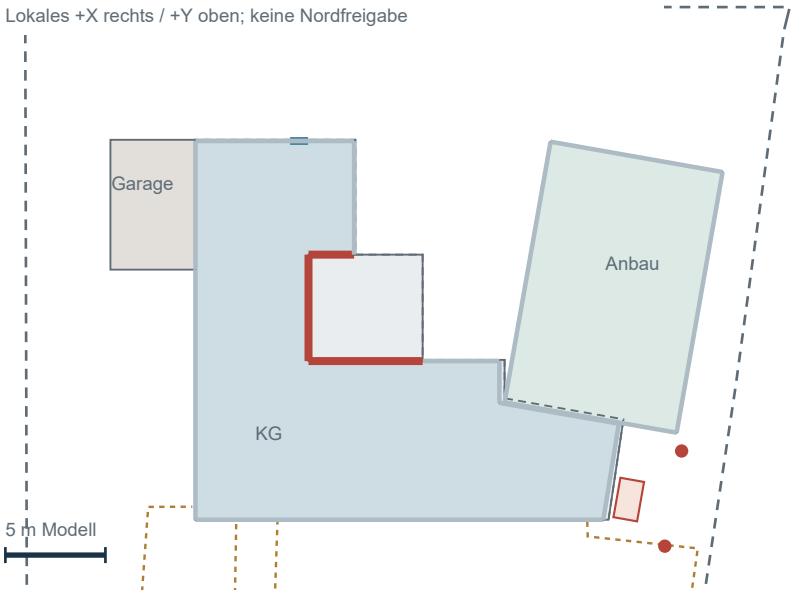

Konturlänge: 13.305 m (Modell)

Variantenbewertung

A/B als Standard-Außengraben gesperrt. EG überragt den KG-Umriss erheblich; Zugänglichkeit und Lastabtrag fehlen.

Besondere Konflikte

EG-Kontur reicht zwischen y=7990 und 13250 bis x=11355; KG nur bis x=5650; Keine normal von aussen zugaengliche Fassade nachgewiesen; Tragkonstruktion/Bestandsanschluss ungeklärt; Konturen nicht anpassen


SCH-PS05-Fnn

Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_05: (11355; 7930) → (5650; 7930) | KG_AW_06: (5650; 7930) → (5650; 13250) | KG_AW_07: (5650; 13250) → (7930; 13250)


A/B unten nur Prinzipbilder; Standard-Außengraben hier gesperrt.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS06 | Äußere Kellerfassade

Aushub-/Schachtblatt PS06 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

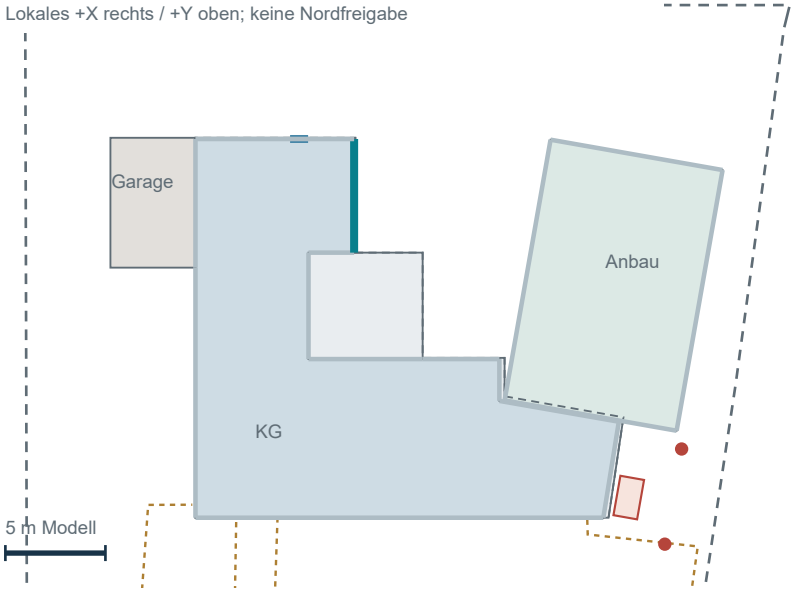

Konturlänge: 5.680 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_08: (7930; 13250) → (7930; 18930)

Variantenbewertung

A/B offen. Fenster und beide Endanschlüsse berücksichtigen; Rand-/Lagerflächen und Bauzustände prüfen.


Besondere Konflikte

Kellerfenster; EG-Kontur um etwa 60 mm versetzt; Fundamente/Baugrund/Wasser nicht belegt

SCH-PS06-Fnn


Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS07 | Lichtschacht und Garagenecke

Aushub-/Schachtblatt PS07 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

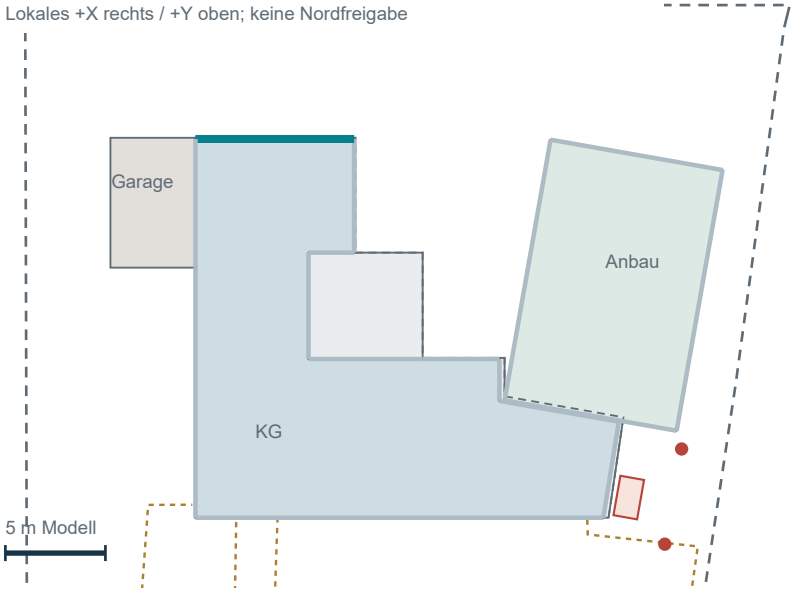

Konturlänge: 7.930 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_09: (7930; 18930) → (0; 18930)

Variantenbewertung

A/B offen. Lichtschacht erst aufnehmen; Garagenecke und Fensteranschluss getrennt bemessen.


Besondere Konflikte

Historischer Lichtschachthinweis ohne Schachtmasse; Garagenecke bei x=0; EG-Versatz; Fundamente/Baugrund/Wasser nicht belegt

SCH-PS07-LIC


Lichtschacht als Quellenhinweis. Fensterbezug X 4730–5630 / Y 18930 mm ist kein Schachtmaß.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS08 | Garagenanschluss

Aushub-/Schachtblatt PS08 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

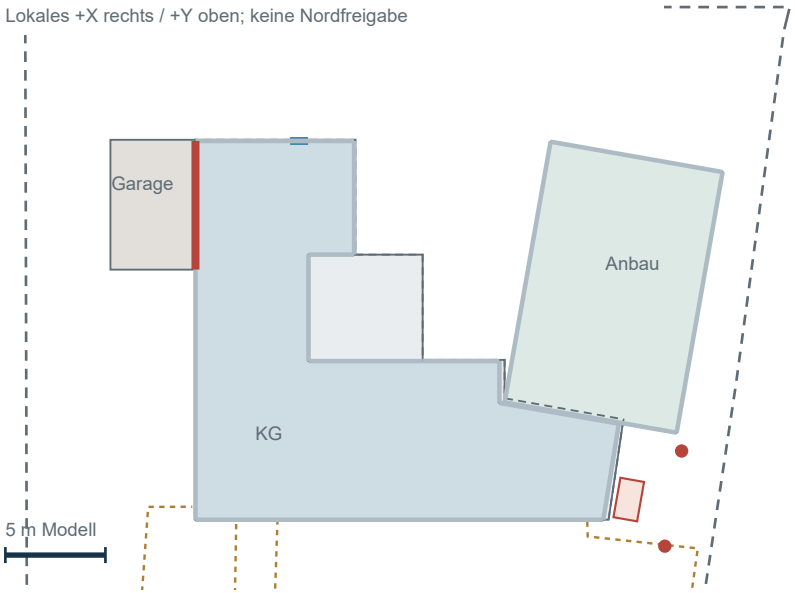


Konturlänge: 6.430 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_10: (0; 18930) → (0; 12500)


A/B unten nur Prinzipbilder; Standard-Außengraben hier gesperrt.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Variantenbewertung

A/B als Standard-Außengraben gesperrt. Garage liegt außen an. Fundament, Verbindung und Sanierungszugang klären.

Besondere Konflikte

Garage unmittelbar auf Aussenseite; nicht unterkellert laut Quellenregister; Garagenboden und Fundamente fehlen; Kein gewoehnlicher frei erreichbarer Aussengraben

SCH-PS08-Fnn

Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS09 | Längsseite und Telefon

Aushub-/Schachtblatt PS09 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

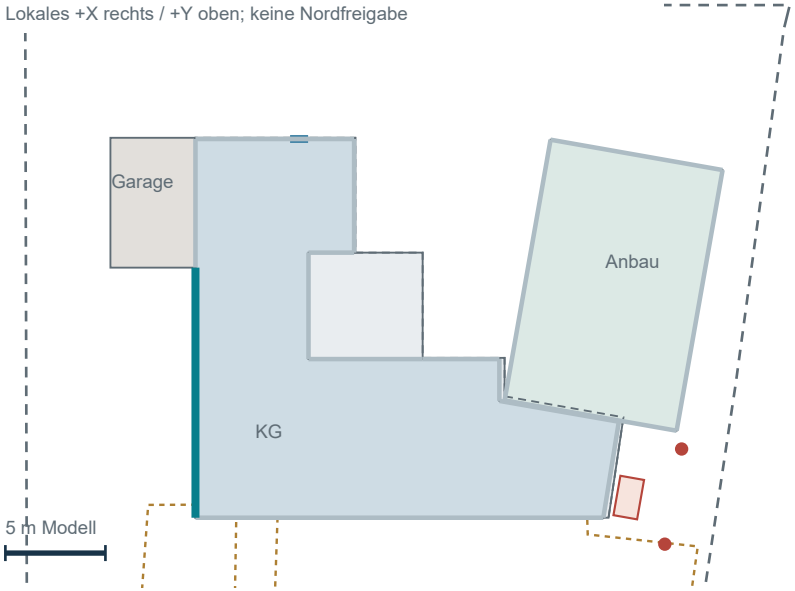

Konturlänge: 12.500 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: KG_AW_10: (0; 12500) → (0; 0)

Variantenbewertung

A/B offen. Garagenende und Telefontrasse als Sonderbereiche; Medienortung vor Festlegung von Arbeitsfeldern.


Besondere Konflikte

Kellerfenster; Telefon-Hausanschluss nahe y=650; Tiefe unbekannt; Garagenuebergang und Ecke y=0 gesondert pruefen

SCH-PS09-MED


Telefontrasse historisch. Bedarf und Lage einer Arbeitskammer erst nach aktueller Ortung festlegen.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Haupt-KG: −2605 mm nur Prüfziel

PS10 | Anbauanschluss

Aushub-/Schachtblatt PS10 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

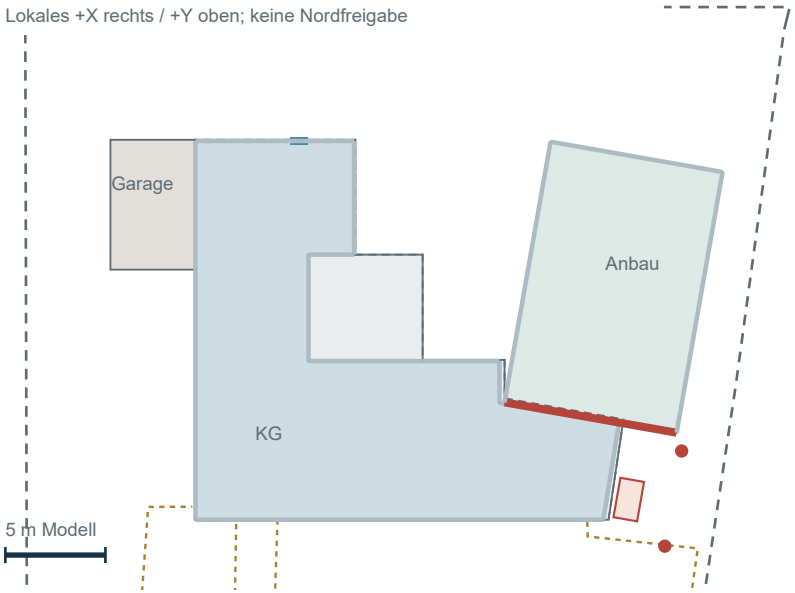


Konturlänge: 8.730 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: AN_KG_AW_01: (15450; 5865) → (24047; 4349)


A/B unten nur Prinzipbilder; Standard-Außengraben hier gesperrt.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Variantenbewertung

A/B derzeit gesperrt. Anschluss und freien Endbereich nach Aufmaß trennen; keinen sicheren Trennpunkt erfinden.

Besondere Konflikte

Teilweise Hauptbau direkt gegenueber; Anschlussbereich nicht als freier Graben nutzbar; Freier Endbereich und Anschluss erst nach Bestandsklaerung trennen; Anbau-Bodenplatte und Fundament fehlen; Zieltiefe unbekannt

SCH-PS10-Fnn

Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Anbau: Prüfziel unbekannt

PS11 | Anbau / Grenzengpass

Aushub-/Schachtblatt PS11 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

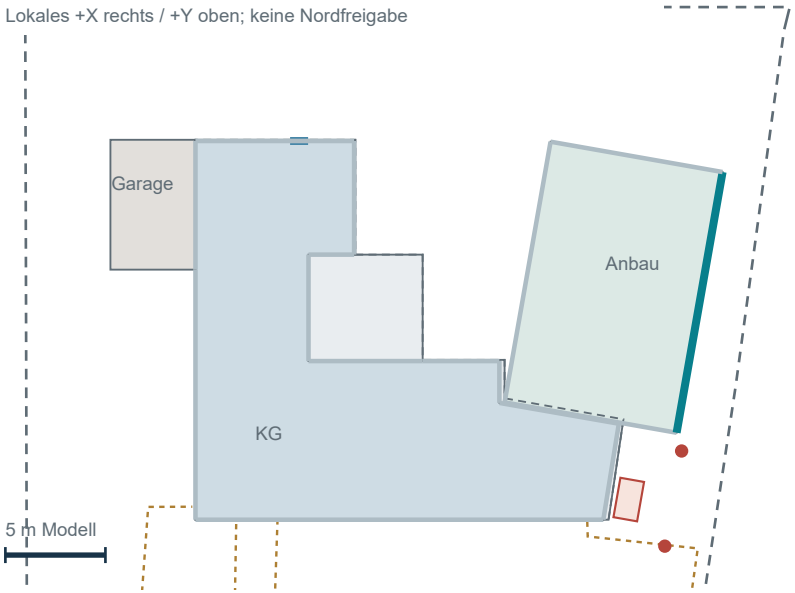

Konturlänge: 13.230 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: AN_KG_AW_02: (24047; 4349) → (26345; 17378)

Variantenbewertung

B vorrangig untersuchen. A nur mit vollständigem Raumnachweis. Kartengrenzabstand mindestens ca. 2088 mm; keine freien Rückanker.


Besondere Konflikte

Geringster Modellabstand zur Kartengrenze ca. 2088 mm; Boeschung/Verbau/Rueckverankerung/Wege innerhalb Grenze nachzuweisen; Anbau-Bodenplatte und Fundament fehlen; Zieltiefe unbekannt

SCH-PS11-Fnn


Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Anbau: Prüfziel unbekannt

PS12 | Anbauecke / Grenze

Aushub-/Schachtblatt PS12 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

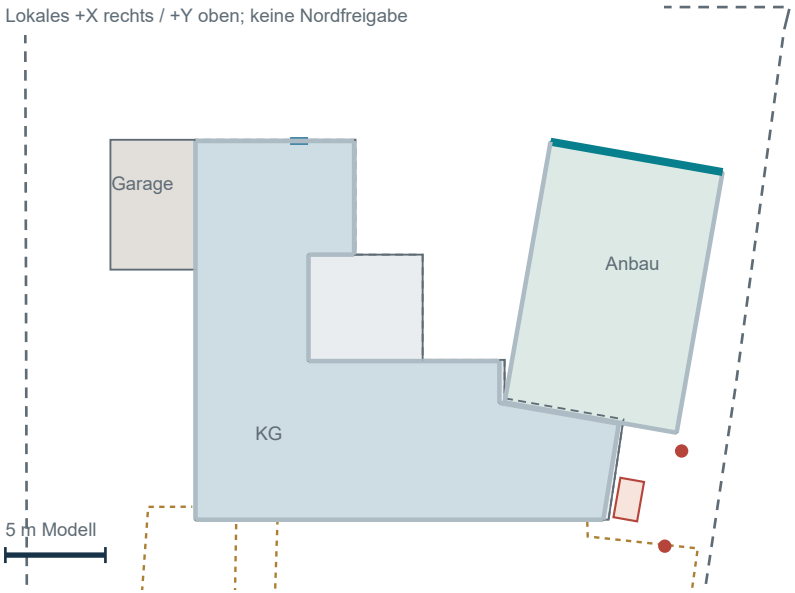

Konturlänge: 8.730 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: AN_KG_AW_03: (26345; 17378) → (17747; 18894)

Variantenbewertung

A/B offen, Engpass an PS11-Ecke. Kartengrenzabstand dort ca. 2088 mm. Eckköffnung separat nachweisen.


Besondere Konflikte

Grenzengpass an rechter Ecke, geringster Modellabstand ca. 2088 mm; Ecke nicht gleichzeitig mit benachbartem Sektor oeffnen ohne Fachnachweis; Anbau-Bodenplatte und Fundament fehlen; Zieltiefe unbekannt

SCH-PS12-Fnn


Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen


Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Anbau: Prüfziel unbekannt

PS13 | Anbau / Hofseite

Aushub-/Schachtblatt PS13 | Planungssektor, keine offene Abschnittslänge | Unterbaugruppe vorgesehen

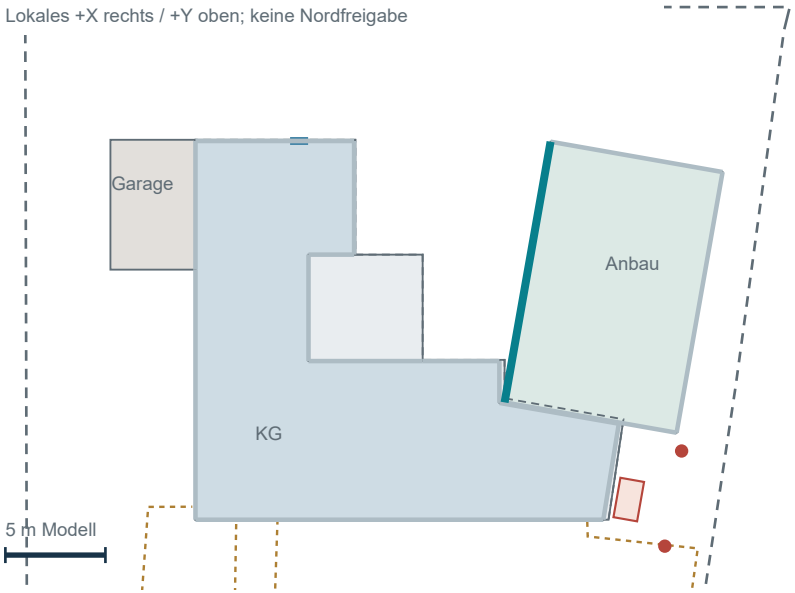

Konturlänge: 13.230 m (Modell)

Gerichtete Außenkanten, X/Y in mm: AN_KG_AW_04: (17747; 18894) → (15450; 5865)

Variantenbewertung

A/B offen. Engen Anschluss unten, Hofzugang und unterschiedliche Kellerhöhen berücksichtigen.


Besondere Konflikte

Untere Ecke mit engem Hauptbauanschluss; Unterschiedliche Hauptbau-/Anbauhoehen; Anbau-Bodenplatte und Fundament fehlen; Zieltiefe unbekannt

SCH-PS13-Fnn


Arbeitsfeld-Schacht nur bei Erfordernis. Anzahl, Lage und Maße nach Nachweis; kein vorhandener Schacht behauptet.

A | Böschung (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

B | Verbau (unbemessen)



* Schema; Fundament / Aufstandsfläche unbekannt

Vor Ausführung auszufüllen

Feldstation/Länge: offen
Sohle / Arbeitsraum: offen
Sicherung / Wasser: offen
Mengen / Lager: offen
Baufolge / Offenzeit: offen
Nachweise U01–U06 / H2–H3

Keine Ausführungsfreigabe

Anbau: Prüfziel unbekannt

Bauablauf und Bodenbilanz

Eine Sektion kann mehrere Arbeitsfelder und Bauzustände enthalten. Keine vorgegebene Umlaufrichtung.

Phase	Ergebnis / Haltepunkt
P0 / H0	Untersuchung beauftragen; sichere Erkundungsmethoden vorgeben.
P1 / H1	Aufmaß, Gründung, Boden, Wasser, Medien, Grenzen belastbar; Varianten aktualisieren.
P2 / H2	Revisionsgleiche Statik, Sicherung, Abdichtung, Feldfolge und Baustellenplanung freigeben.
P3 / H3	Baustelle vorbereiten, Beweissicherung/Ausgangsmessung, Zugang/Medien/Logistik kontrollieren.
P4 / H4	Erstes bemessenes Feld: tatsächlichen Befund mit Annahmen vergleichen; Abweichung stoppt.
P5 / H5–H6	Gesicherter Aushub → Untergrund → Abdichtung/Dämmung/Schutz → Abnahme → Verfüllung/Rückbau nach Plan.
P6 / H2	Sonderbereiche in die fachlich festgelegte Folge integrieren; nicht pauschal zuletzt.
P7 / H7	As-built, Fotos, Material-/Prüfnachweise, Mengenbilanz und Nachkontrollen abschließen.

Ein offenes Feld als organisatorischer Standard. Erst nach Abschluss und wiederhergestellter Stützwirkung das nächste öffnen. Das ersetzt keine Bemessung von Länge, Ecke und Offenzeit. Bei Bewegung, Bodenaustrag, unerwartetem Wasser oder Leitung: stoppen und neu bewerten.

Bilanz je Zustand: Anfangslager + Aushub/Anlieferung − Wiederverwendung/Abfuhr = Endlager. Masse oder konsistent umgerechnete Volumina verwenden. Auflockerung und Verdichtung sind verschiedene Größen; derzeit keine belegten Faktoren oder m³-Mengen.

Kontrolle vor Schichtbeginn sowie nach relevanten Witterungs-/Laständerungen; Messgrenzen vor Start festlegen. Lager- und Maschinenlasten gehören in den Nachweis. [Q01, Q10]

NX-Unterbaugruppen und nächste Entwicklung

Zielstruktur; in V01 keine neuen Maßnahmen-.prt erzeugt. Bestehende G02-Lieferung bleibt unverändert.

Ebene	Aufgabe / Schutzregel
Renovierung_Basis	Vollständiger unabhängiger G02-Klon, keine bearbeitbaren Rückreferenzen auf Originale.
Renovierung_BAxxx	Eigene gespeicherte Zustände mit unveränderter Lage; keine Referenzen auf andere BA.
SEKTIONEN / PS01 … PS13	Dauerhafte räumliche Zuordnung; Nummer ist keine Baufolge.
FELDER / F001 …	Erst nach Bemessung: Station, Länge, Tiefe, Variante, Nachweise und Freigabestatus.
Maßnahmen je PS/F	Aushub A/B, Sicherung, Zugang, Schächte/Ecken, Abdichtung, Dämmung/Schutz, Verfüllung, Sperren.
BAUSTELLE	Lager/Transport, Wasser, Messpunkte, Grundstück; Mengen und Lasten synchron zum BA.

Entwicklungsfolge mit Superpowers
K-S01 Sektionsmodell → K-S02 unabhängige NX-Testkopie/Unterbaugruppe → K-S03 Nachweisregister → K-S04 A/B- und Schachtgeometrie → K-S05 Zustände/Bilanz → K-S06 Planableitung. Vollständige Prompts im Projektplan; Voraussetzungen der bestehenden Roadmap P00–P10 bleiben gültig.

Prüfung pro Umsetzung: Quellen-/Originalhashes, vollständige Komponenten, mm, Lage, interne Pfade, frisches und verschobenes Wiederöffnen. Neue K02-Quellen in den NX-Fingerprint aufnehmen. Ein G02-PASS darf nicht als Nachweis einer geplanten K02-Funktion erscheinen.

Planungsdaten: renovierung/planung/2026-11-01/sektionen.json. Prüfprotokoll im selben Ordner. Die aktuellen 29 G02-Parts sind versioniert; neue native Lieferungen künftig unter cad/nx via Git LFS.

Primärquellen und Nachweisgrenzen

Recherche 01.11.2026. Öffentlich zugängliche Hinweise und Metadaten; keine vollständige Normprüfung.

Q01 **BG BAU C467 (07/2021): Ausschachtungen neben Gebäuden**
https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_467/c_467.htm

Q02 **BG BAU C468 (07/2017): Gründungen / Unterfangungen**
https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_468/c_468.htm

Q03 **BG BAU C469 (07/2021): Geböschte Baugruben / Gräben**
https://www.bgbau-medien.de/app/daten/bausteine/c_469/c_469.htm

Q04 **BG BAU BauPortal 2/2025: Planung aller Bauzustände; Sand / Wasser**
https://bauportal.bgbau.de/bauportal-22025/anwendung-der-baustellenverordnung-bei-baugruben-und-graeben

Q05 **DIN 4123:2013-04 (Metadaten): Arbeiten am Gebäudebestand**
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-4123/170468164

Q06 **DIN 4124:2012-01 (Metadaten): Böschungen, Verbau, Arbeitsraum**
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-4124/147362129

Q07 **DIN 18533-1:2026-06: Abdichtung; Anwendungsgrenze im Bestand**
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-18533-1/399850897

Q08 **WTA 4-6, 12.2024 (Kurzfassung): nachträgliche Abdichtung**
https://www.wta-international.org/fileadmin/user_upload/Geschaeftsstelle/Schriften/Kurzfassungen/4-6-24.pdf

Q09 **DIN 4095-1:2026-06 (Metadaten): Begriffe / Wassereinwirkungen**
https://www.dinmedia.de/de/norm/din-4095-1/397841413

Q10 **DGUV Information 201-052, Kapitel 4: Baugruben und Gräben**
https://www.bgbau-medien.de/handlungshilfen_gb/daten/dguv/201_052/4.htm

G02-Modelldaten sind geschätzt, keine örtliche Vermessung. Fundament-/Boden-/Wasserwerte fehlen. Fachliche Bemessung, sichere Erkundung und Freigabe erfolgen durch beauftragte qualifizierte Planer. Dieses Heft ist deren Vorplanungsgrundlage.
